建筑材料/~~施工方案~~提交审批表

致：梁黄顾建筑师（香港）事务所有限公司/澧信工程顾问有限公司

由：中国建筑第四工程局有限公司（佛山消防设计安装工程有限公司）　　报审日期：2013年5月22日

工程名称	佛禅（挂）2009-014地块-9#地块房地产项目
审批内容	☐材料/设备名称、规格、型号：　点型光电感烟火灾探测器：JTY-GM-FS1027 ☐使用地方：　地下车库、7#～13#楼火灾自动报警系统 ☐使用数量：　☐施工方案
报审事项/合约要求	品牌、生产厂家/供应商深圳市赋安安全系统有限公司　　编号　9# - MT -XF-016(A)

主要内容、附件说明(可加附页)：

- ☑制造商的说明书
- ☐技术资料
- ☑产品合格证
- ☑检验合格证明/已被批准的信件
- ☐使用说明
- ☐审批附表
- ☑样品
- ☐其他，请注明

	抄送	附件
新鸿基香港合约部	☐	☐
新鸿基香港建筑部	☐	☐
新鸿基（广州）工管部	☑	☑
新鸿基（广州）合约部	☐	☐
新鸿基（佛山）建筑部	☑	☑
建筑设计顾问（LWK）	☑	☑
科进香港(WSP)	☐	☐
机电顾问(JRP)	☑	☑
设计院（南方院）	☐	☐
威宁谢	☐	☐
监理	☑	☑

中国建筑第四工程局有限公司
佛禅（挂）2009-014地块-9#地块房地产项目项目经理部

地址：佛山市禅城区澜石一路

联系电话：13760685089

传真：

消防专业施工单位负责人（签字）：程
日　期：2013.5.21

提交方负责人（签字）：
日　期：2013.5.21

审查意见		顾问编号：
☐ 附件 ☐ 建筑师(LWK) ☐ 结构顾问(科进) ☐ 机电顾问（JRP） ☐ 监理 ☐ 南方院 ☐ 建筑部 ☐ 工管部	附件：监理单位意见共___页；顾问公司意见共___页。 ☐A 同意，可接纳 ☐B 有条件接纳，具体按批注意见执行。 ☐C 资料不全，按批注意见增补后再提交进行复审。 ☐D 不接纳，按批注意见增补后再提交进行复审。 ☐E 无本专业意见/见其他批注意见 ☐F 有造价增加更改	
	批注意见：	

	抄送	附件
新鸿基香港合约部	☐	☐
新鸿基香港建筑部	☐	☐
新鸿基（广州）工管部	☐	☐
新鸿基（广州）合约部	☐	☐
新鸿基（佛山）建筑部	☐	☐
建筑设计顾问（LWK）	☐	☐
科进香港(WSP)	☐	☐
机电顾问(JRP)	☐	☐
设计院（南方院）	☐	☐
威宁谢	☐	☐
监理	☐	☐
佛山消防	☐	☐

备注

本次审查不包括具体尺寸、数量的审定。
本次审查目的次仅为确认报审文件符合设计意图。
任何意见或修订要求不应被视为已同意做出合约的修改/设计变更。
承建商文件通过审查后，乃需履行其合约责任，并符合国家，地方相关法规要求。
承建商在重新报审时，应将修订之处用云线标识

顾问公司/设计院签署	_____（签字）：_____ 日　期：_____

工程材料、构配件、设备报审表

GD220209□□

单位(子单位)工程名称	佛禅（挂）2009-014地块-9#地块房地产项目

致 广州穗科建设监理有限公司 （项目监理机构）：

我方于_____ 年 ____ 月 ____日进场的工程材料/构配件/设备数量如下（见附件）。现将质量证明文件及结果报上，拟用于下述部位： 地下车库、7～13号楼火灾自动报警系统 。

请予以审核。

附件:1、数量清单(包括名称、来源和产地、用途、规格)。

2、出厂质量证明文件

项目经理部（项目章）

项目负责人：

日　　期：2013 年 5月22日

进场前审查意见：

项目监理机构（项目章）

专业监理工程师/总监代表：

日　　期：

使用前审查意见：

项目监理机构（项目章）

总/专业监理工程师：

日　　期：　　年　　月　　日

附：承包单位报送的必要复试报告

№ Dz200900238

2008000170Z　(2008)国认监认字(001)号　检测 CNAS L0259

检 验 报 告

申请单位名称 深圳市赋安安全系统有限公司

产品型号名称 JTY-GM-FS1027 型点型光电感烟火灾探测器

检 验 类 别 认证发证检验

国家消防电子产品质量监督检验中心

产品名称	点型光电感烟火灾探测器	型　号	JTY-GM-FS1027
申请单位	深圳市赋安安全系统有限公司	商　标	
制 造 商	深圳市赋安安全系统有限公司	检验类别	认证发证检验
生产企业	深圳市赋安安全系统有限公司	生产日期	2008 年 10 月
抽 样 者	宋希伟、严洪	抽样地点	成品库
抽样基数	500 只	抽样日期	2009 年 1 月 7 日
样品数量	20 只	到样日期	2009 年 1 月 12 日
样品状态	完好	检验日期	自 2009 年 1 月 12 日 至 2009 年 1 月 22 日
检验依据	GB 4715-2005		
检验项目	全项（除恒定湿热（耐久）、腐蚀试验）		
检验结论	我中心按国家标准 GB 4715-2005《点型感烟火灾探测器》的有关条文要求，对深圳市赋安安全系统有限公司生产的 JTY-GM-FS1027 型点型光电感烟火灾探测器样品进行了认证发证检验。 该送检样品满足 GB 4715-2005《点型感烟火灾探测器》的有关技术要求，判定为合格。 以下空白。 （检验专用章） 签发日期：二〇〇九 年 一 月 二十三 日		
备注			

批准：張德成　审核：刘[illegible]　编制：[illegible]

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

№Dz200900238

申请单位	深圳市赋安安全系统有限公司		
通信地址	深圳市上步南路上步大厦二十一楼		
法人代表	黄康景	邮政编码	518031
传　　真	0755-86315069	联系电话	0755-86315069

产品照片

产品描述：

JTY-GM-FS1027 型点型光电感烟火灾探测器：

1. 外壳材质为塑料。
2. 由探头和底座组成。
3. 采用电子编码方式编码。
4. 具有一个火灾报警确认灯，火灾报警确认灯正常监视状态红色闪亮，火灾报警状态红色常亮。
5. 与深圳市赋安安全系统有限公司生产的 JB-LGZ2-FS5050 型、JB-LBZ2-FS5050 型、JB-LTZ2-FS5050 型火灾报警控制器（联动型），JB-QB-AFN80 型、JB-QBZ2-AFN100 型火灾报警控制器配接。

点型光电感烟火灾探测器检验结果汇总表

申请单位：深圳市赋安安全系统有限公司　　№：Dz200900238

产品型号：JTY-GM-FS1027　　共 7 页 第 4 页

序号	检验项目	标准条款号	检验结果	结论	备注
1	试验前检查	4.1.7、6.2.1、6.3	满足标准要求。	合格	
2	重复性试验	4.2	响应阈值(m) 0.36　0.33　0.33 0.33　0.33　0.34 比值 1.1	合格	
3	方位试验	4.3	响应阈值(m) 0.41　0.40　0.37　0.34 0.33　0.36　0.39　0.41 比值 1.2	合格	
4	一致性试验	4.4	响应阈值(m) 1# 0.36　2# 0.36　3# 0.37 4# 0.37　5# 0.34　6# 0.34 7# 0.36　8# 0.34　9# 0.32 10# 0.32　11# 0.34　12# 0.36 13# 0.36　14# 0.37　15# 0.36 16# 0.36　17# 0.40　18# 0.41 19# 0.39　20# 0.37 $m_{max}:m_{rep}$: 1.14　$m_{rep}:m_{min}$: 1.1	合格	
5	电源参数波动试验	4.5	1# 响应阈值(m) 0.33(供电参数下限)；0.33(供电参数上限) 比值 1.1	合格	
6	气流试验	4.6	2# 响应阈值(m) $m_{(0.2)max}$: 0.358　$m_{(0.2)min}$: 0.330 $m_{(1.0)max}$: 0.302　$m_{(1.0)min}$: 0.302 比值 1.1	合格	
7	环境光线试验	4.7	3# 响应阈值(m) 最不利方位：0.46(环后) 比值 1.2 旋转90°方位：0.41(环后) 比值 1.1	合格	
8	高温试验	4.8	4# 响应阈值(m) 0.39（环后）　比值 1.1	合格	
9	低温（运行）试验	4.9	5# 响应阈值(m) 0.29（环后）　比值 1.2	合格	
10	恒定湿热（运行）试验	4.10	6# 响应阈值(m) 0.32（环后）　比值 1.1	合格	
11	冲击试验	4.13	9# 响应阈值(m) 0.33（环后）　比值 1.0	合格	
12	碰撞试验	4.14	10# 响应阈值(m) 0.39(环后)　比值 1.2	合格	

点型光电感烟火灾探测器检验结果汇总表

申请单位：深圳市赋安安全系统有限公司　　№：Dz200900238

产品型号：JTY-GM-FS1027　　共 7 页 第 5 页

序号	检验项目	标准条款号	检验结果	结论	备注
13	振动（正弦）（运行）试验	4.15	11# 响应阈值(m) 0.34（环后）　比值 1.0	合格	
14	振动（正弦）（耐久）试验	4.16	11# 响应阈值(m) 0.34（环后）　比值 1.0	合格	
15	射频电磁场辐射抗扰度试验	4.17	12# 响应阈值(m) 0.34（环后）　比值 1.1	合格	
16	射频场感应的传导骚扰抗扰度试验	4.18	13# 响应阈值(m) 0.33（环后）　比值 1.1	合格	
17	静电放电抗扰度试验	4.19	14# 响应阈值(m) 0.37(环后)　比值 1.0	合格	
18	电快速瞬变脉冲群抗扰度试验	4.20	15# 响应阈值(m) 0.34（环后）　比值 1.1	合格	
19	浪涌（冲击）抗扰度试验	4.21	16# 响应阈值(m) 0.34（环后）　比值 1.1	合格	
20	火灾灵敏度试验	4.22	试验火　编号　m(dB/m)　y SH1　17#　0.42　0.45 18#　0.46　0.44 19#　0.37　0.39 20#　0.37　0.39 SH2　17#　0.52　0.99 18#　0.54　1.01 19#　0.49　0.94 20#　0.46　0.87 SH3　17#　1.01　4.12 18#　1.09　4.41 19#　0.97　3.94 20#　0.96　3.89 SH4　17#　1.08　5.48 18#　1.09　5.56 19#　1.06　5.45 20#　0.92　4.91	合格	

以下空白。

射频电磁场辐射抗扰度试验布置示意图			
设备名称	电磁兼容测试系统		
设备型号	标准 3 米法	校准状态	合 格

受试设备连接图：



试验布置示意图：

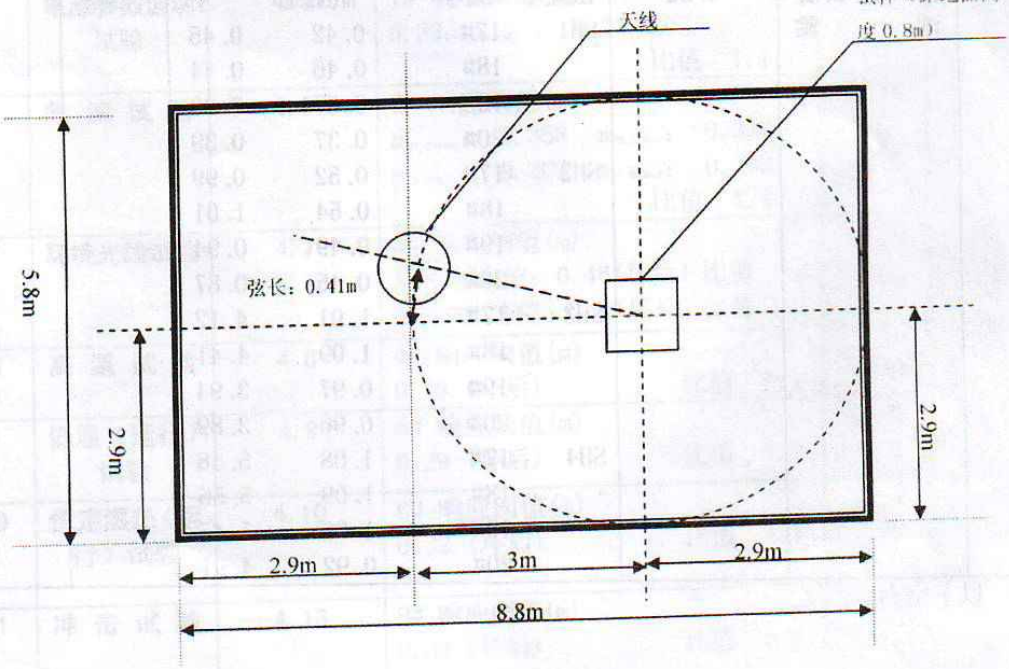

射频场感应的传导骚扰抗扰度试验布置示意图			
设备名称	电磁兼容测试系统		
设备型号	CHA9652B	校准状态	合 格

受试设备连接图：



试验布置示意图：

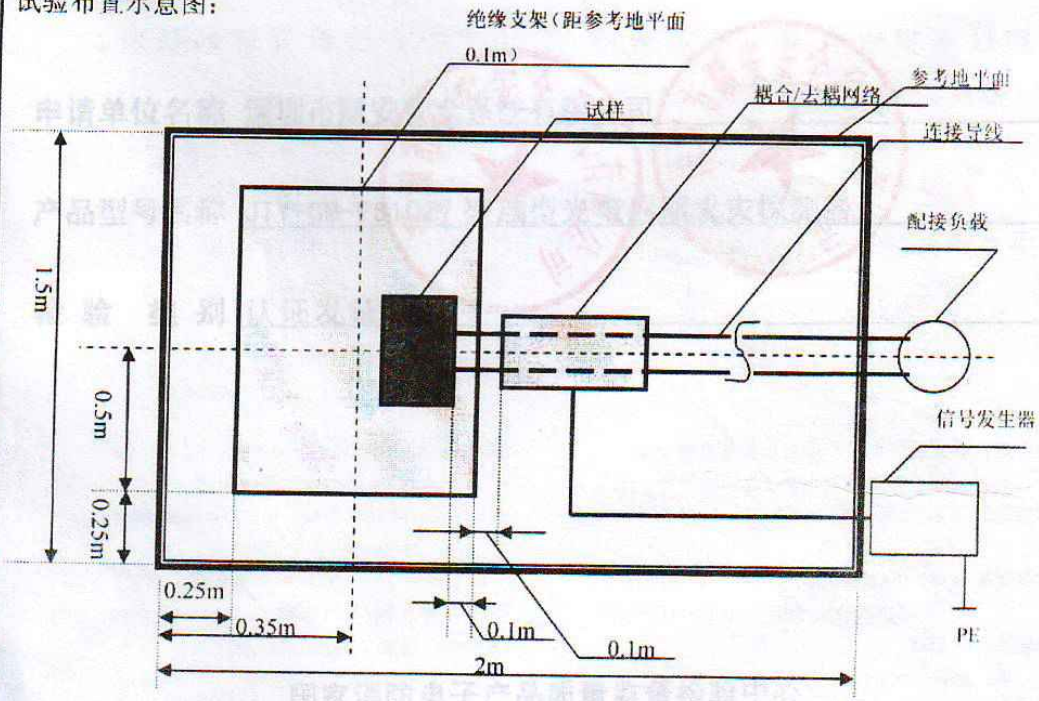

中国国家强制性产品认证证书

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

证书编号：2012081801001275

委 托 方： 深圳市赋安安全系统有限公司

所 在 地： 广东省深圳市南山区科技园南区高新南一道 013 号赋安科技大楼 A 座 505、六、七、八层

制 造 商： 深圳市赋安安全系统有限公司(H000124)

所 在 地： 广东省深圳市南山区科技园南区高新南一道 013 号赋安科技大楼 A 座 505、六、七、八层

生 产 厂： 深圳市赋安安全系统有限公司

所 在 地： 广东省深圳市南山区科技园南区高新南一道 013 号赋安科技大楼 A 座 505、六、七、八层

产品名称： 点型光电感烟火灾探测器

认证单元： JTY-GM-FS1027

内 含： JTY-GM-FS1027(主型)
JTY-GF-FS1028

产品认证实施规则 ： CNCA-09C-044:2011

产 品 认 证 模 式 ： 工厂质量管理体系审核+认证发证检验+认证后监督

产 品 标 准 ： GB4715-2005

上述产品符合强制性认证实施规则 CNCA-09C-044:2011 的要求，特发此证。

首次发证日期：2009-02-19

发（换）证日期：2012 年 07 月 30 日 有效期至：2014 年 02 月 18 日

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 和

中国消防产品信息网站 www.cccf.com.cn 查询

CNAS 产品认证 CNAS C073-P

深圳市赋安安全系统有限公司

发证机构名称（盖章）

公安部消防产品合格评定中心

中国消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲108号 100077

http://www.cccf.net.cn

A 0004642
